A Myotis Barlangkutató Egyesület 2015 évi kutatásjelentése

MYOTIS Barlangkutató, Természetjáró és Természetvédő Egyesület
1115 Budapest, Bartók Béla út 134.

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
3304 Eger pf. 9

MYOTIS Barlangkutató egyesület
1115 Budapest, Bartók Béla út 134 sz.

Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett kutató, barlangfeltáró munkákról

László bányamester-barlangja
Érdemi munkát nem végeztünk ebben a barlangban 2015-ben.

Vöröskő-völgyfői-barlang
Érdemi munkát nem végeztünk ebben a barlangban 2015-ben.

Kopasz-réti-barlang
Érdemi munkát nem végeztünk ebben a barlangban 2015-ben.

Hármaskúti-víznyelőbarlang
Érdemi munkát nem végeztünk ebben a barlangban 2015-ben.

Peskő-katlani-barlang
Érdemi munkát nem végeztünk ebben a barlangban 2015-ben.

Vöröskő-oromi-barlang (5343-160) hossza 39 m, mélysége +6, -1,6 m. A feltárása kezdetekor hossza. 12 m, mélysége +6 m volt.

A barlang bejárati részéből további nagy alapterületű lapos járatba jutottunk tovább négynapnyi munkával, átlag 7 fő közreműködésével. Az anyagmozgatást felhasított műanyag kanna oda-vissza húzogatásával oldottuk meg. Kiegészítettük az új feltárás felmérésével a barlang térképét.

Fekete-sári-sziklaodú (5332-21) 31 m, mélysége +8,5, -2 m. A feltárása kezdetekor hossza. 22 m, mélysége +6 m volt.

Folytattuk az üreg kitöltésének felszínre juttatását négynapnyi munkával. Az anyagmozgatást továbbra is felvágott 20 literes műanyag edénnyel oldottuk meg, oda-vissza húzogatva. A továbbjutással kecsegtető hasadék bejáratát nagyobb mélységben értük el a munkákkal.
Aktualizáltuk a barlang térképét vázlat pontosságú felméréssel.

Kőháti Meander-barlang (5342-24) hossza 59 m, mélysége +3, -26 m. A feltárása kezdetekor hossza. 12 m, mélysége -6 m volt.

Folytattuk a barlang kitöltésének felszínre juttatását 46 napi teljes műszakban átlag 3-4 fő közreműködésével. Ennek eredményeként az évben kb. 50 m3-t juttattunk a felszínre, amit az előtérben "teraszként" terítettünk el, minimalizálva az üledékkel takart felületet. Az eddig közel vízszintes járat nagy meredekségbe fordult. A 20 m hosszú bejárati szakaszon szállítópályát építettünk ideiglenes jelleggel. A végpontjánál függőleges anyagmozgatással 16 m hosszban folytattuk a feltárást, így a barlang hossza kb. 50 m, mélysége 30 m. A barlang függőlegesbe fordult alsó szakaszán a tanúfalként meghagyott részek üledék vizsgálatát el kell végeznünk, mert el kell bontani a későbbiekben a balesetveszélyessége miatt., ugyan is nagyobb beszivárgás idején megrogyhat az agyagos üledék 16 m magas fala.
Északi irányból egy kevésbé fejlett vízvezető járat csatlakozik be. A járat szelvényének szűkössége miatt nem tudjuk tovább feltárni (egyelőre). A főjáratba két lépcsőben vízköpővel érkezett, mindkettő alatt örvényüsttel.
A barlang betemetődésének, feltöltődésének szakaszosságára vall a jelentős számú laminális szeptáriás gumók jelenléte (kalcitos beszivárgástól átitatódott kövült agyagok).
Aktualizáltuk a barlang térképét a pillanatnyi állapotnak megfelelően függőkompaszos fix pontos felméréssel, hogy dokumentálni tudjuk az elvégzett munkát.

Ilus-kúti-barlang (zsomboly) (5343-23) hossza 73 m, mélysége +2, -14 m. A feltárása kezdetekor hossza. 18 m, mélysége -8 m volt


Javasoljuk a barlang elnevezésének megváltoztatását „zsombolyról" „barlangra", mivel a mellékelt felmérések szerint téves és megtévesztő genetikai megnevezés a zsomboly.
A munmka kezdetekor a barlang vég-és egyben mélypontjánál levő járat kitöltését kezdtük felszínre juttatni, átlag 6 fő közreműködésével. 10 munkanapot követően sikerült. Először a bejárati lejtőre ácsoltunk egy 4 m hosszú létra-csúszdát, továbbá a felszínre kútkereket telepítettünk, segítendő az anyagmozgatást, utána a hasadék mélyülésével először egy 4 m hosszú, majd további 2 m-rel megtoldott létracsúszdát ácsoltunk. Az anyagmozgatást elektromos csörlővel segítettük ezen a szakaszon. Kb. 10 m3 kitöltés eltávolítása után a hasadék kiszélesedett, és levegős járatba tudtunk behatolni. Vízszintesen 4-5 m-t behatolva tölcsérszerűen záródik a hasadék alja függőleges csőszerű lukakkal. Ennek a kitöltését is elkezdtük a felszínre juttatni. A bejutási pontnál a hasadék felszökik kb. 10 m-t, közel egy magasságba a bejárattal. Ezen a szinten több felé ágazik a barlang, és a kitöltésen kisállat nyomokat találtunk. Ezt követve a felszín közelében majdnem teljesen eltömődve, de új nyitott bejáratot találtunk. Mivel erről a pontról a pillanatnyi végpontra viszonylag egyszerűen szállítópályát fűzhetnénk, elkezdtük ennek is a kibontását, kitágítását.
Felmértük és elkészítettük a barlang térképét az eltávolított kitöltés helyét is jelölve.

2015-12-31

Lengyel János kutatásvezető

MYOTIS Barlangkutató,
Természetjáró és Természetvédő
Egyesület
1115 Budapest, Bartók B. út 134.
Adószám: 18078453-2-43


Fekete-sári-sziklaodú

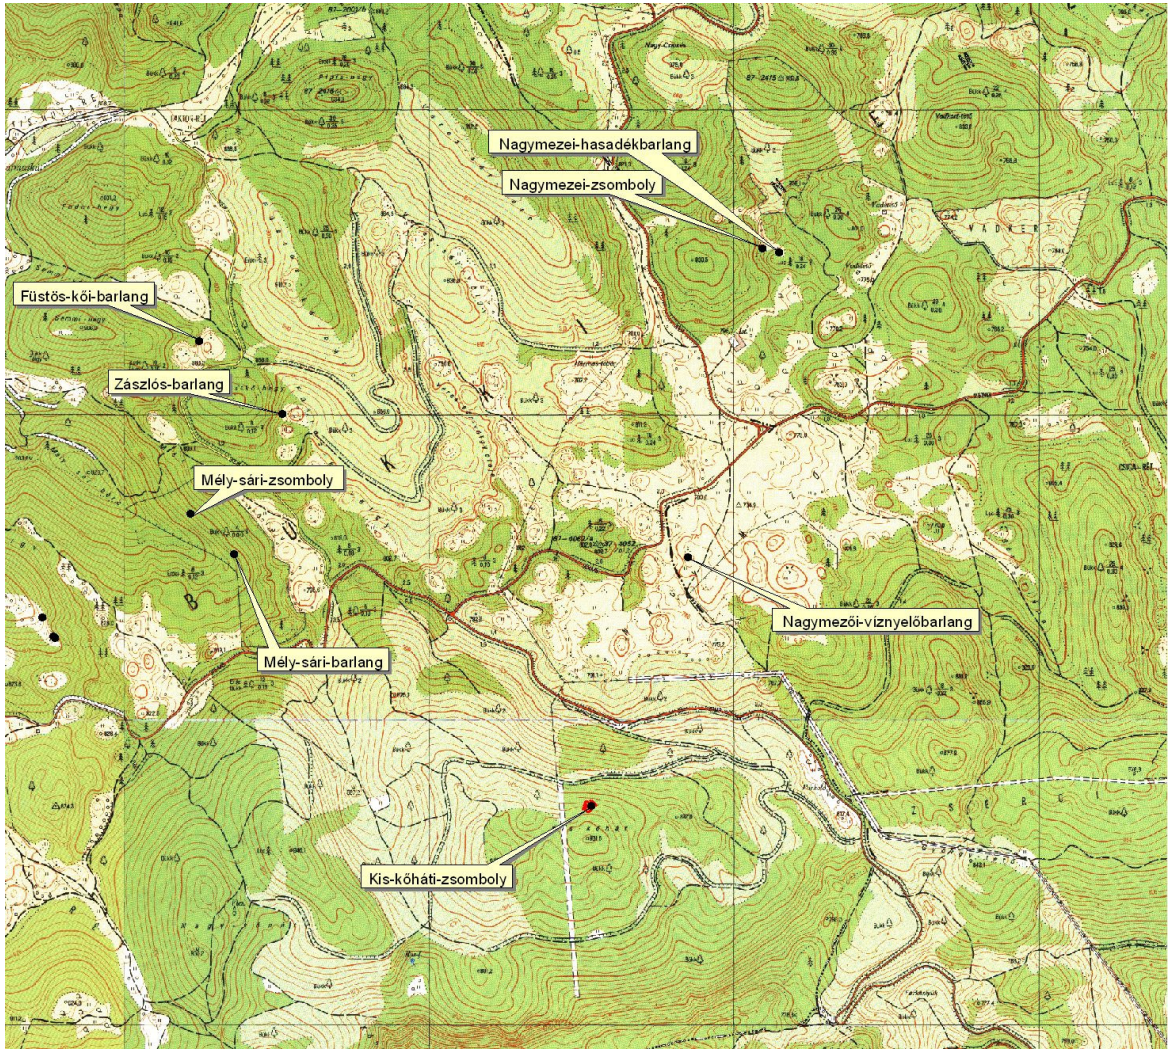



Fekete-sári-sziklaodú

kataszteri szám: 5332-21



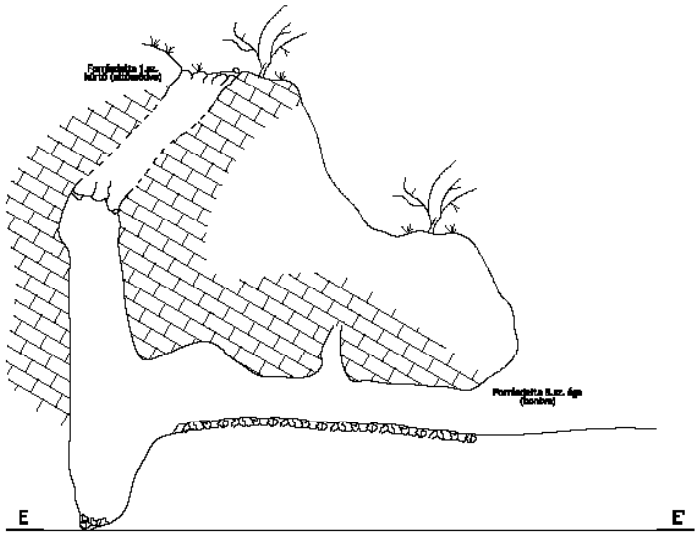


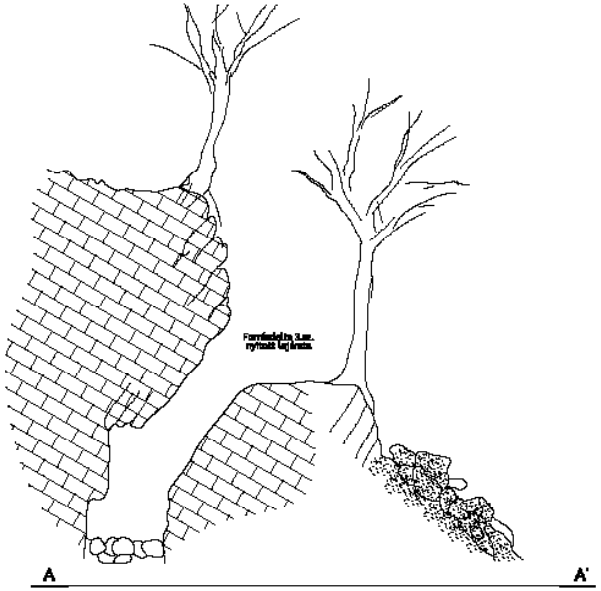







ALAPRAJZ

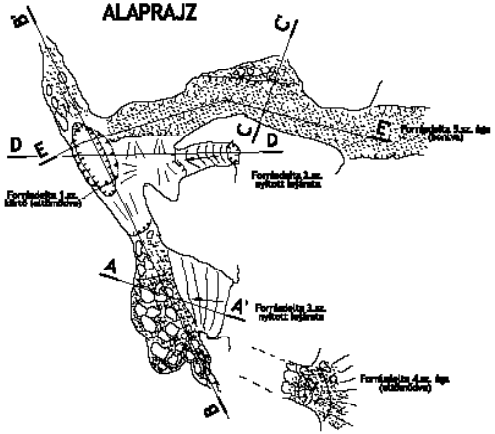

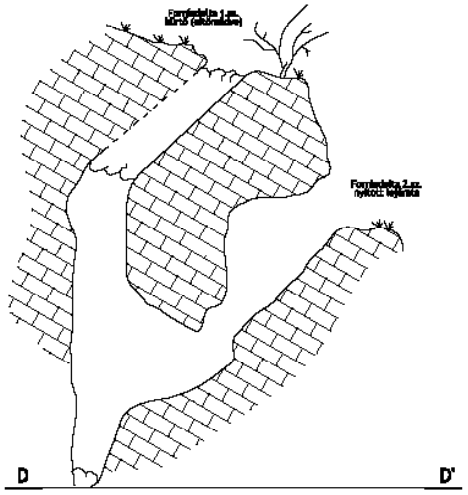

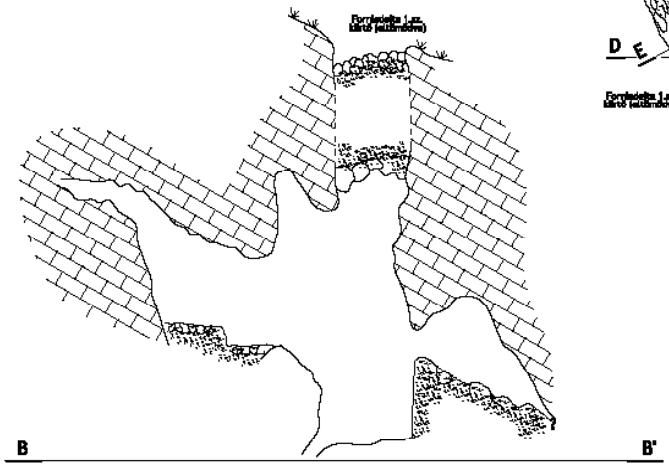

-VÁZLAT-


Felmérte:	MYOTIS Barlangkutató Egyesület 2015.
Műszer:	Függőkompasz
Felmérési mód:	Fix pontokkal
Felmérte:	Barta István; Lengyel János; Rózsa Imre
Rajzolta:	Bóta Péter


Fekete-sári-sziklaodú


kataszteri szám: 5332-21

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

A kitöltés szintje a feltárómunka kezdetén

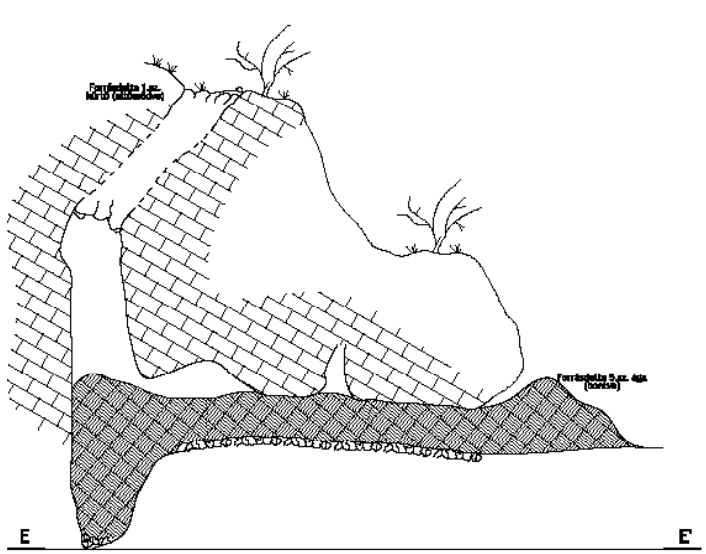


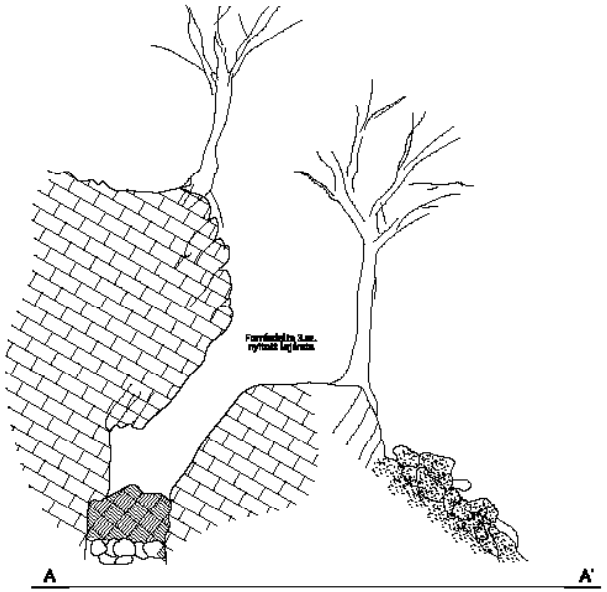





ÉSZAK

ALAPRAJZ

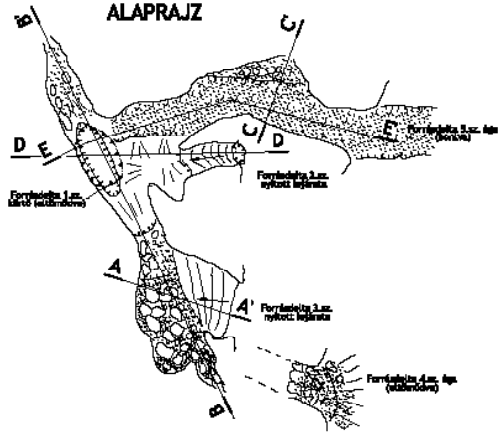

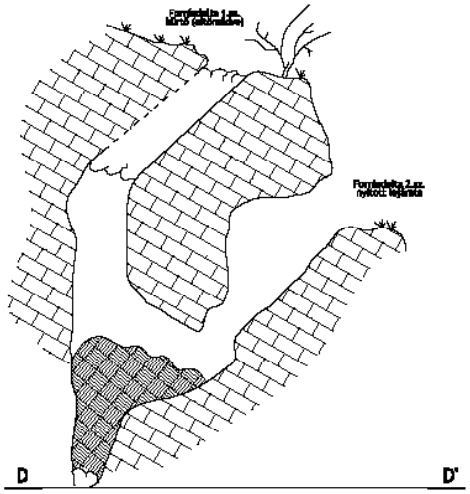

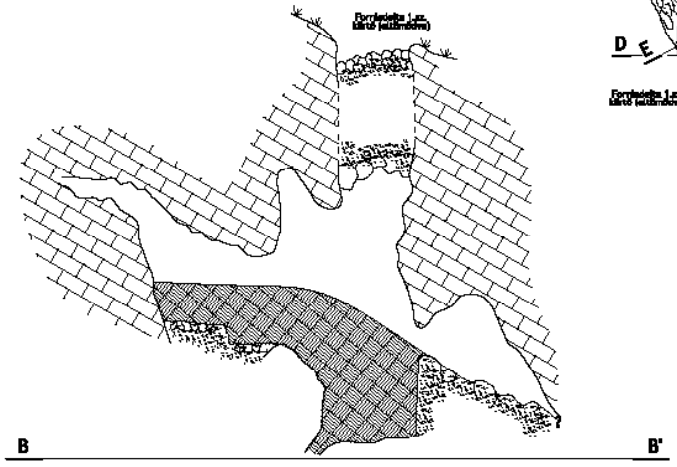

JELMAGYARÁZAT

Előbontott kitöltés

Másodlagos kitöltés

Bemosott agyagos kitöltés

-VÁZLAT-

Felmérte:
MYOTIS Barlangkutató Egyesület 2015.

Mőszer:	Függőkompasz
Felmérési mód:	Fix pontokkal
Felmérte:	Barta István; Lengyel János; Rózsa Imre
Rajzolta:	Bóta Péter


26/12/2014 12:59


09/03/2014 14:51


02/01/2015 18:01







2015.04.27 16:41


2015.04.28 12:54

2015.04.28 12:55

Vöröskő-oromi-barlang

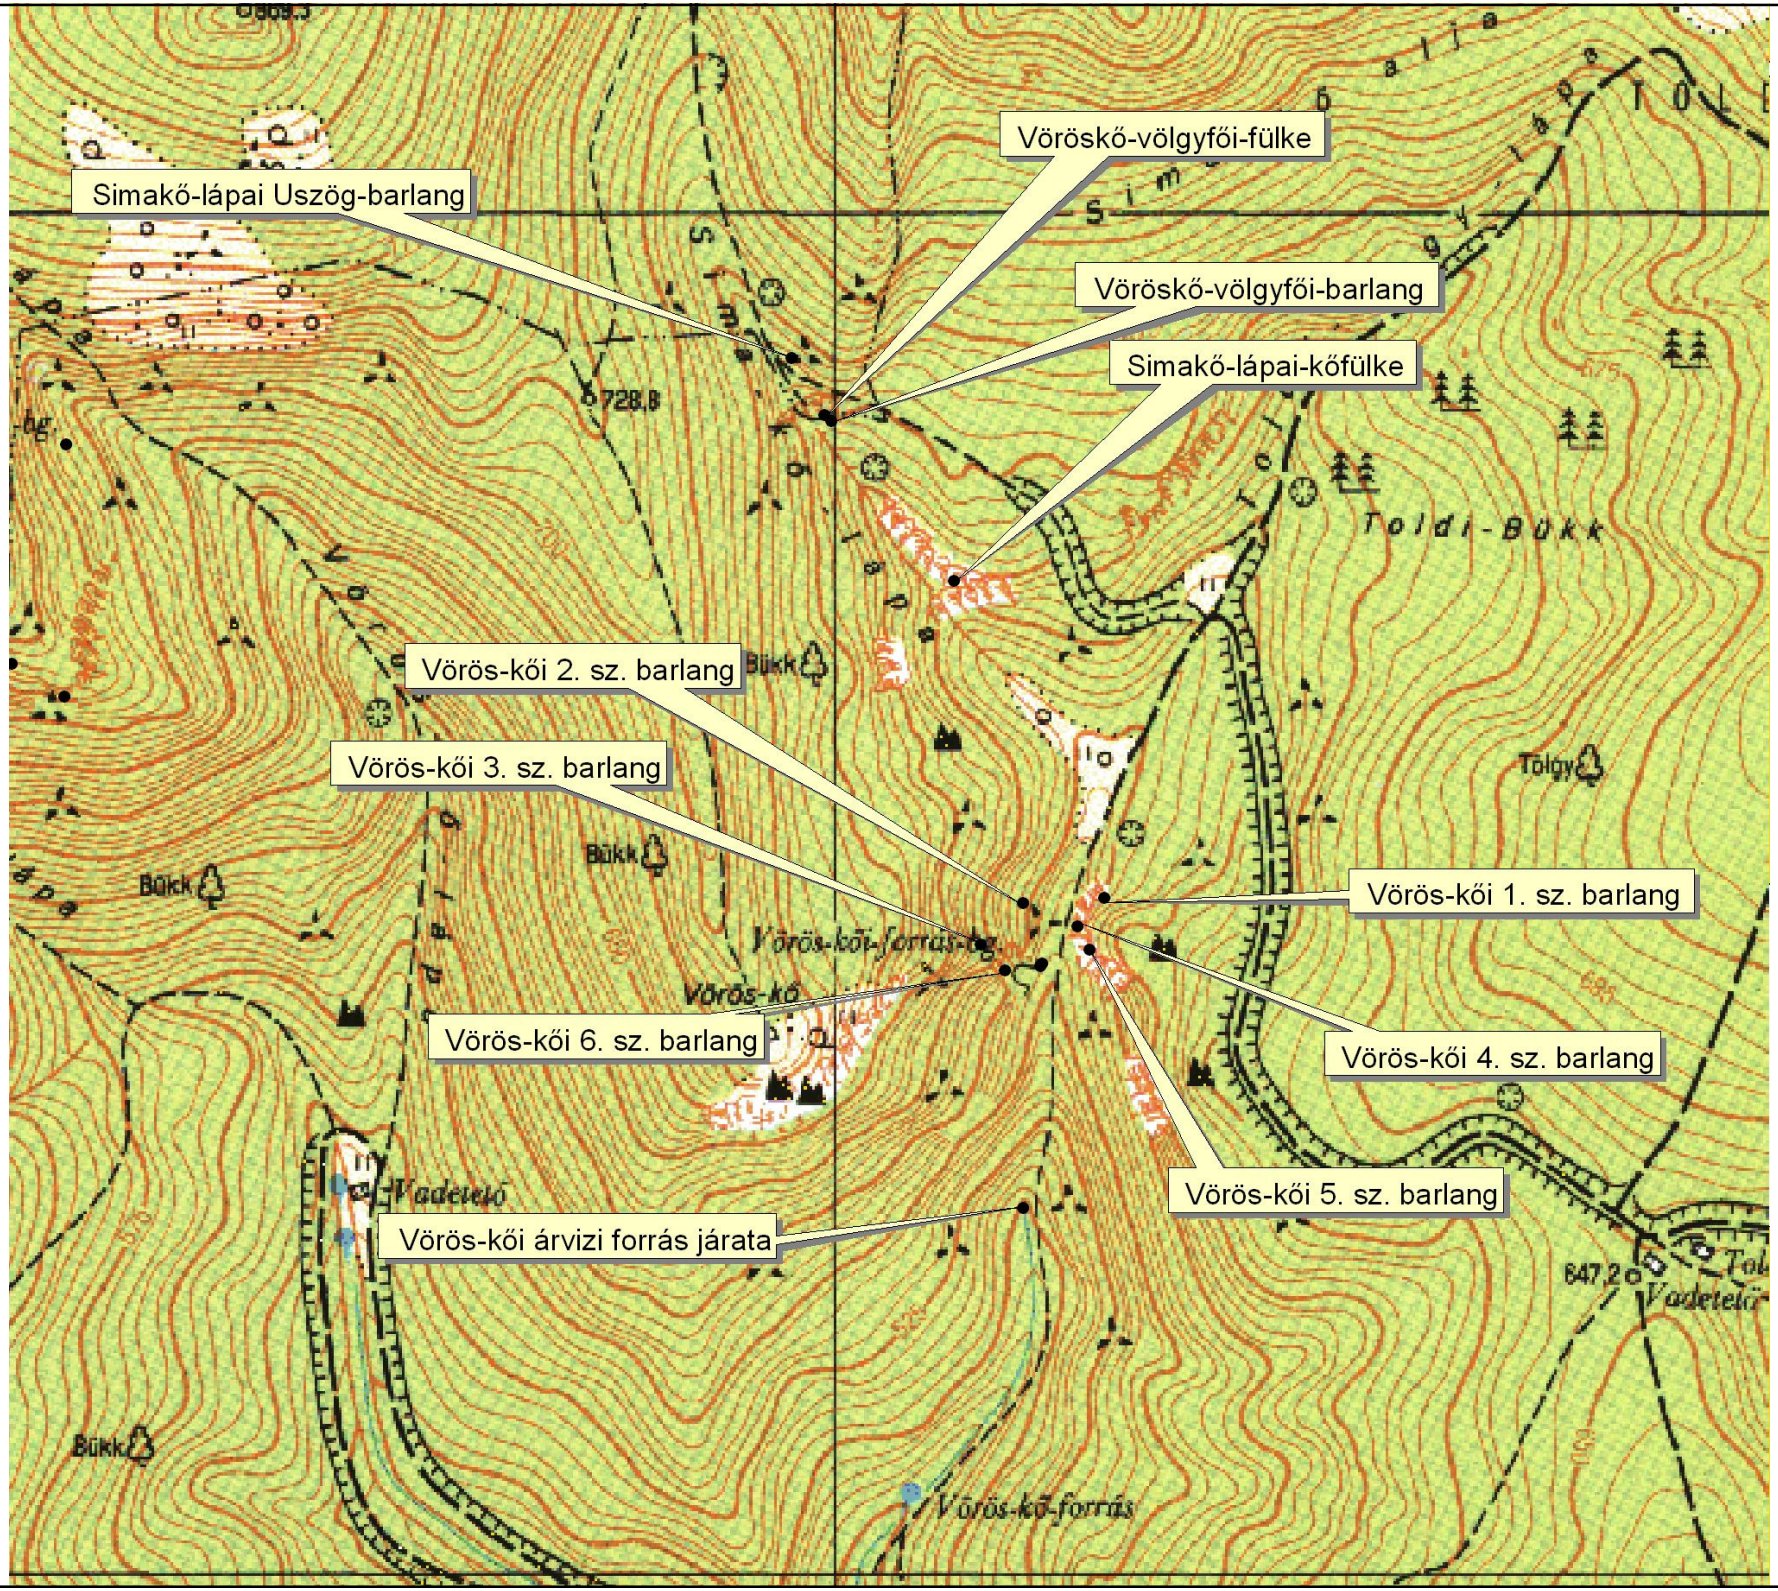
Vöröskő-völgyfői-fülke
Simakő-lápai Uszög-barlang
Vöröskő-völgyfői-barlang
Simakő-lápai-kőfülke
Vörös-kői 2. sz. barlang
Vörös-kői 3. sz. barlang
Vörös-kői 1. sz. barlang
Vörös-kői 6. sz. barlang
Vörös-kői 4. sz. barlang
Vörös-kői 5. sz. barlang
Vörös-kői árvizi forrás járata
Vörös-kő-forrás
Toldi-Bükk
Bükk
Tölgy
Vadetető

Vöröskő-oromi-barlang

kataszteri szám: 5343-160

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

JELMAGYARÁZAT

Előontott kőtömb


Mészkő


Beomlott: egyagas kőtömb


Tűzrehajtott: egyagas kőtömb


ÉSZAK


ALAPRAJZ

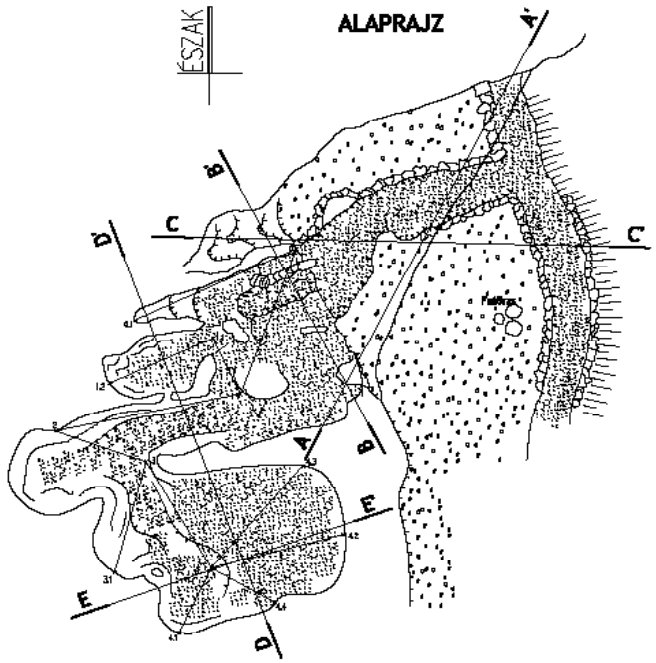


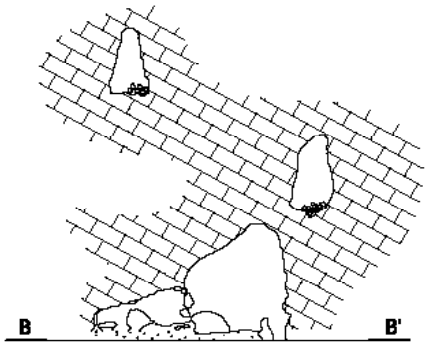





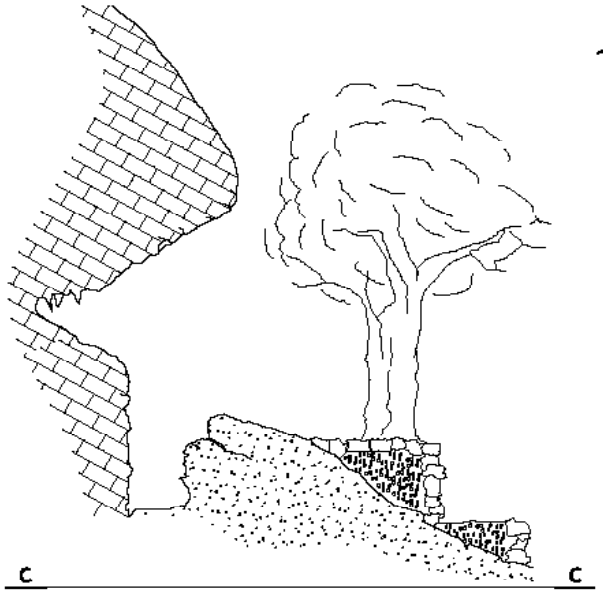

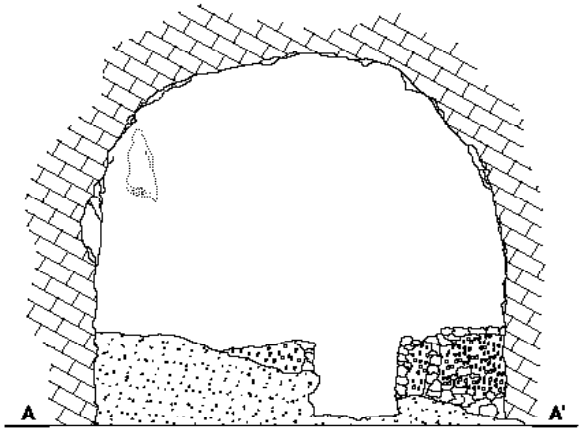

-VÁZLAT-

Felmérte:	MYOTIS Barlangkutató Egyesület 2015.
Műszer:	SUUNTO kompasz
Felmérési mód:	Vesztett pontokkal
Felmérte:	Bóta Péter, Lengyel János
Rajzolta:	Bóta Péter, Lengyel János

Vöröskő-oromi-barlang

kataszteri szám: 5343-160

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m


A kitöltés szintje a feltárómunka kezdetén


JELMAGYARÁZAT


Elbontott kőtömb


Kőomlás


Összemosott egységes kitöltés

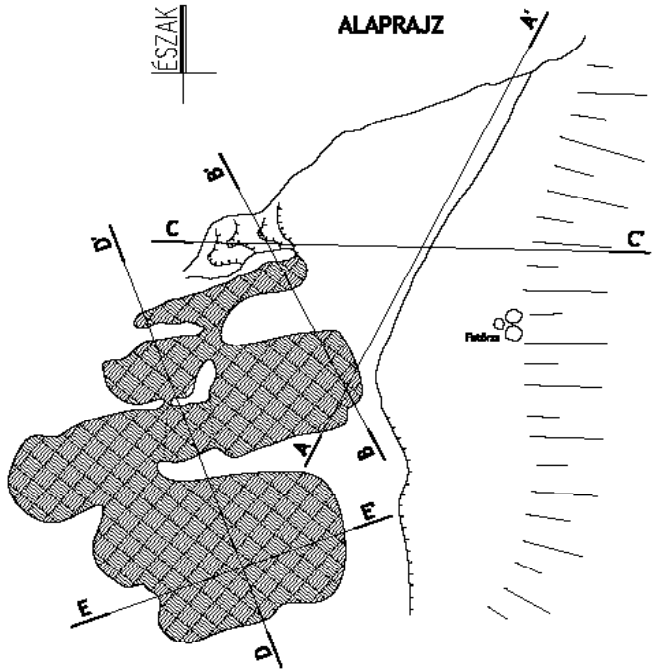


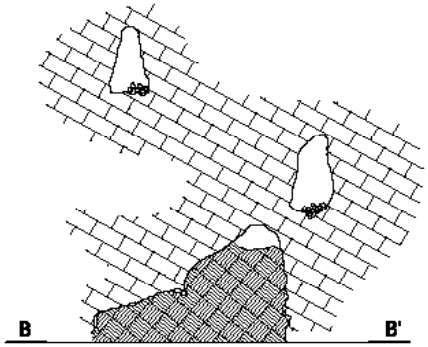





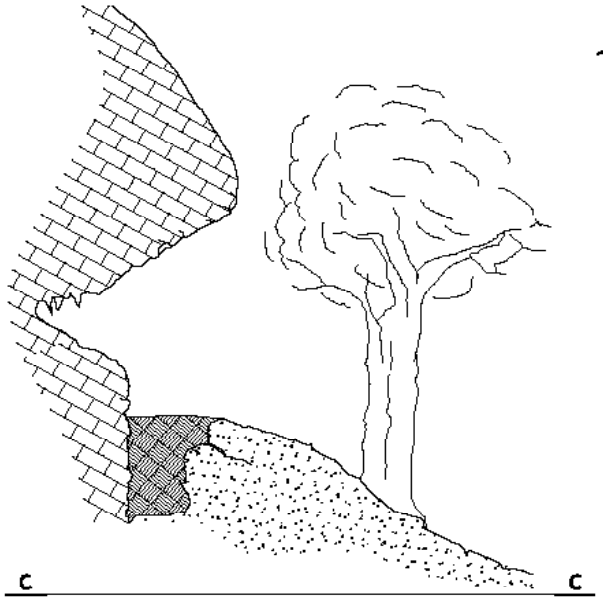

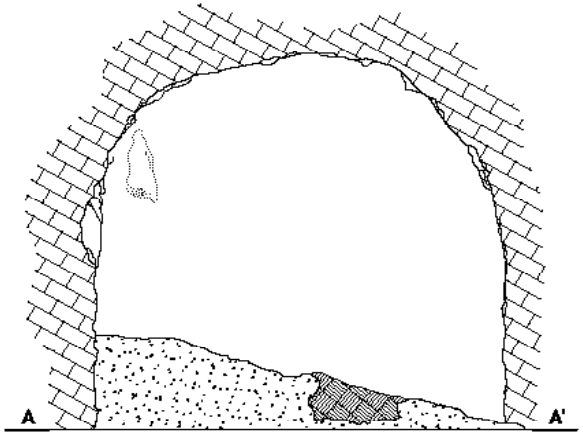

-VÁZLAT-

Felmérte:
MYOTIS Barlangkutató Egyesület 2015.

Műszer:	SUUNTO kompasz
Felmérési mód:	Vesztett pontokkal
Felmérte:	Bóta Péter, Lengyel János
Rajzolta:	Bóta Péter, Lengyel János





13/04/2014 17:48


2015.05.03 16:24



2015.05.03 16:18


13/04/2014 18:07


13/04/2014 17:50

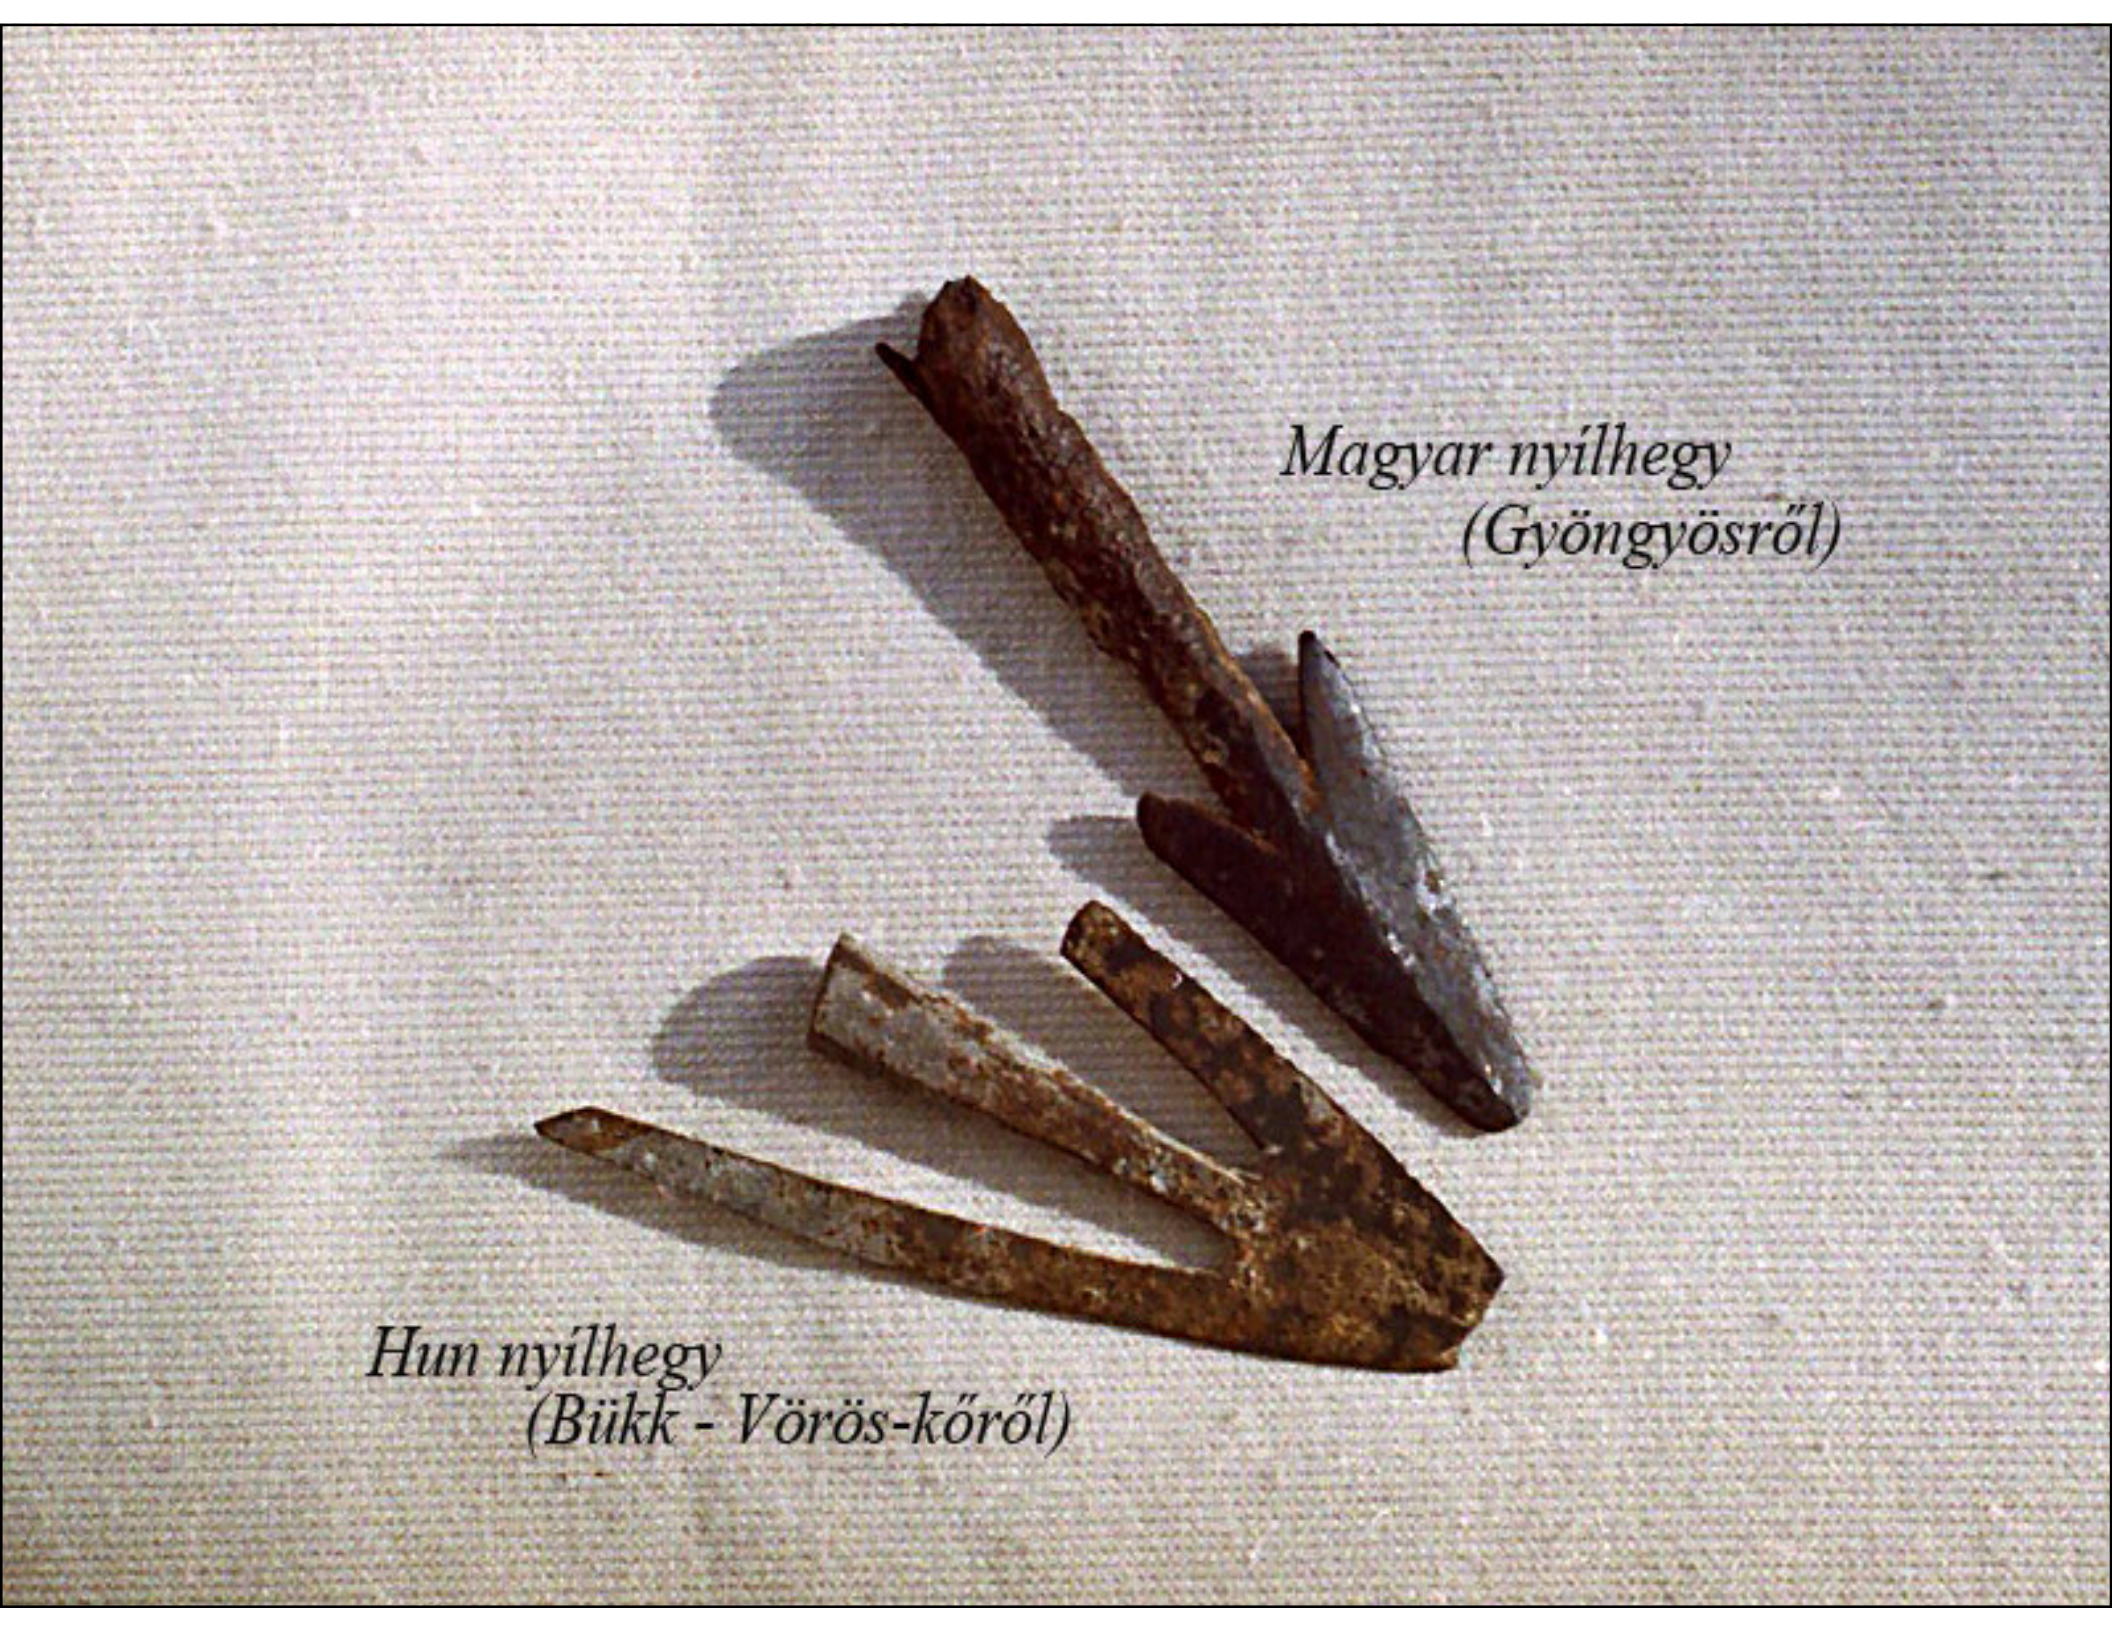
Magyar nyílhegy
(Gyöngyösről)
Hun nyílhegy
(Bükk - Vörös-kőről)

Ilus-kúti-barlang

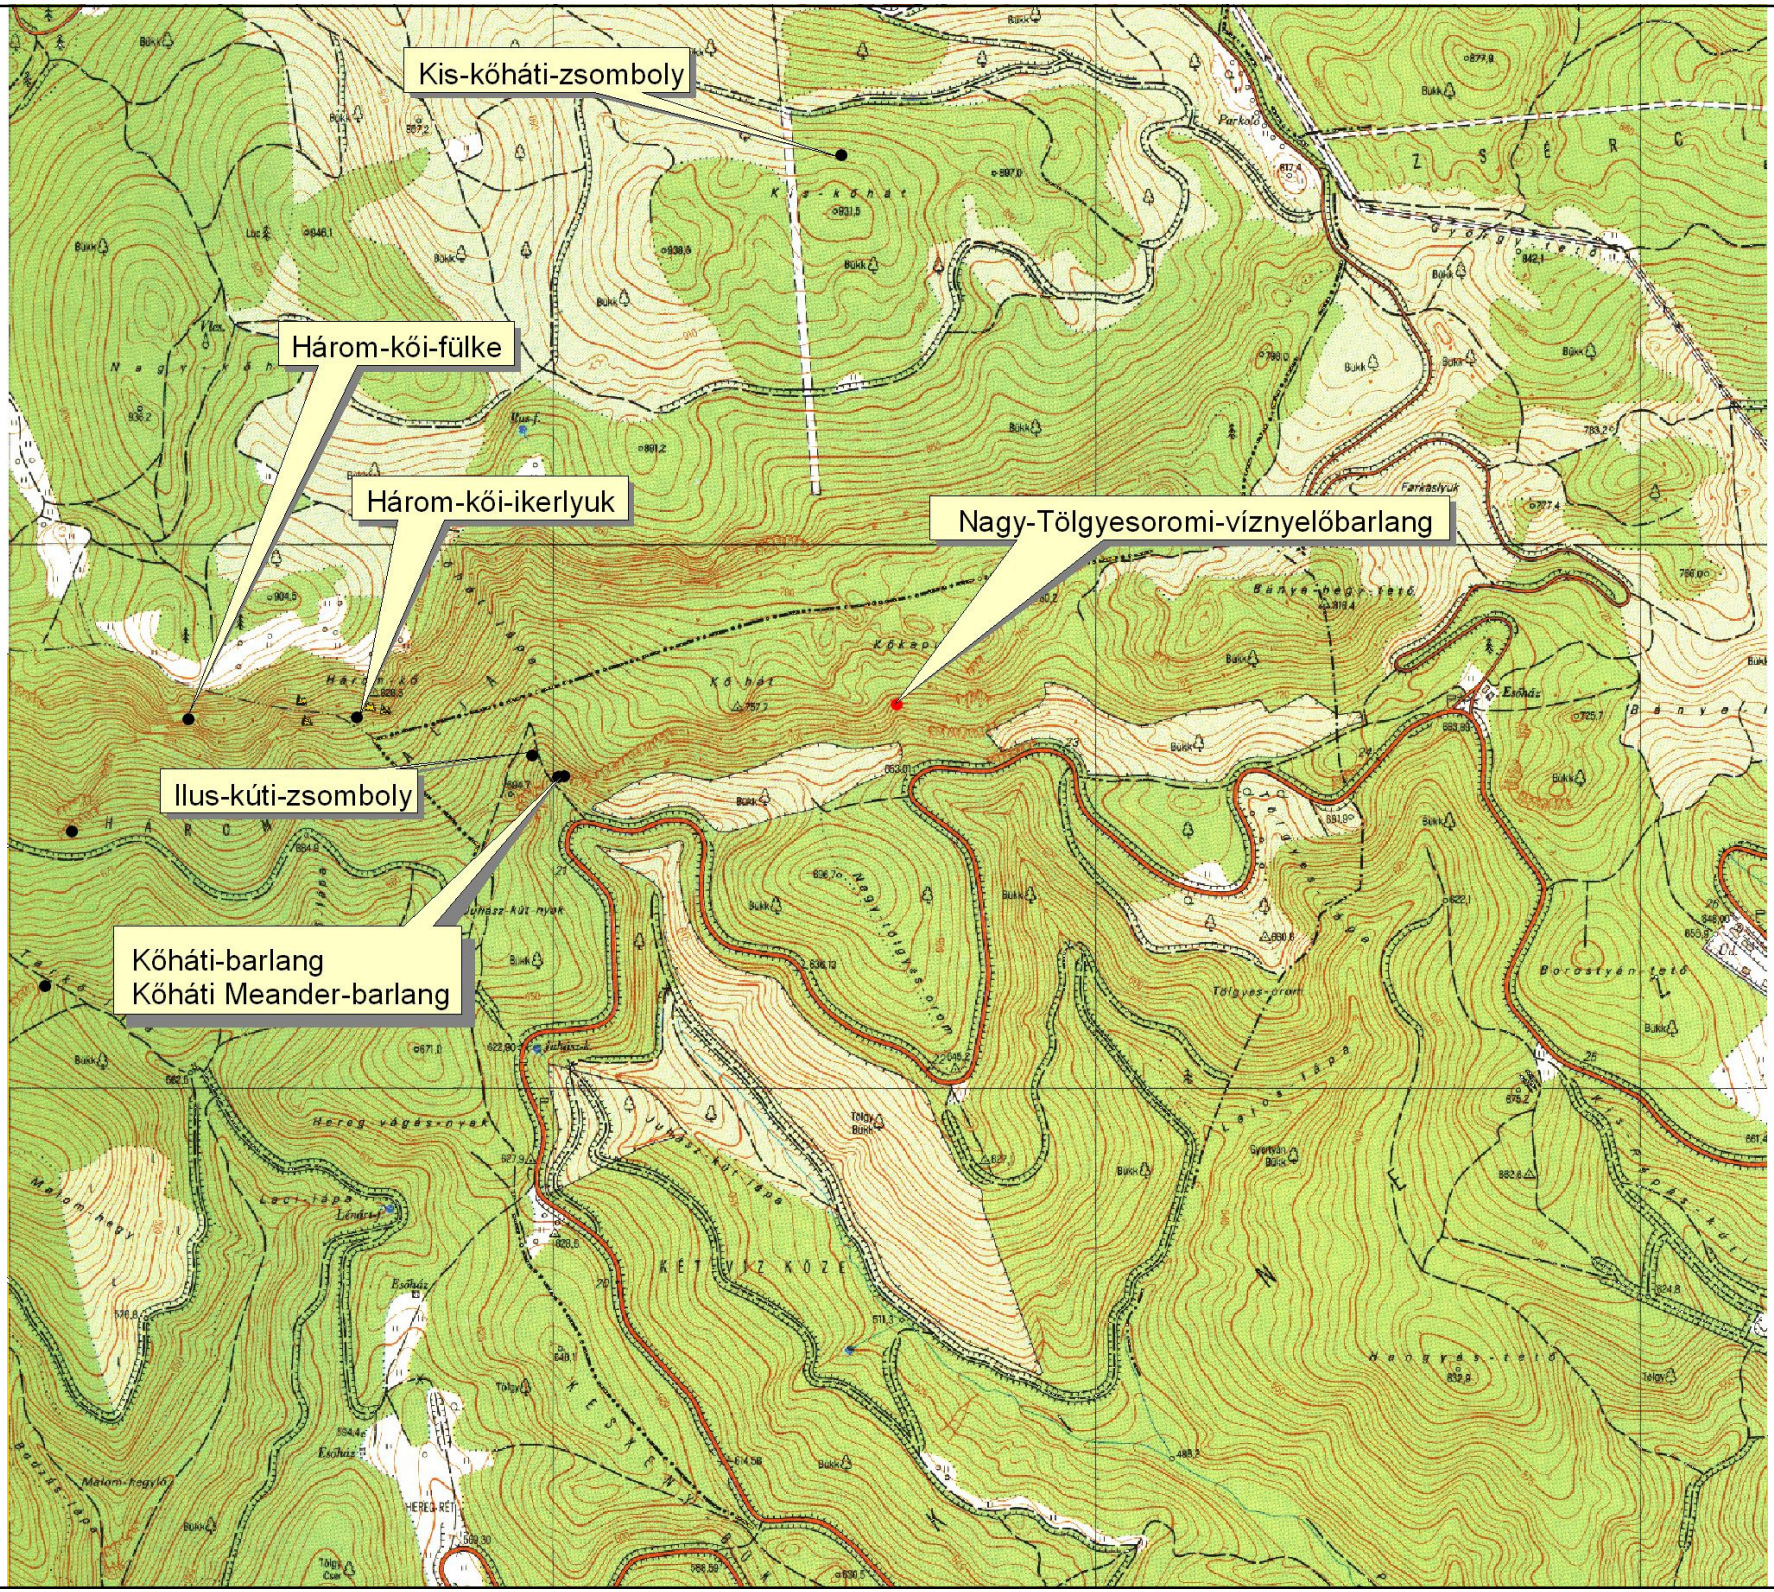
Kis-kőháti-zsomboly
Három-kői-fülke
Három-kői-ikerlyuk
Nagy-Tölgyesoromi-víznyelőbarlang
Ilus-kúti-zsomboly
Kőháti-barlang
Kőháti Meander-barlang


Ilus-kúti-barlang


kataszteri szám: 5343-23


1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m


ÉSZAK


ALAPRAJZ

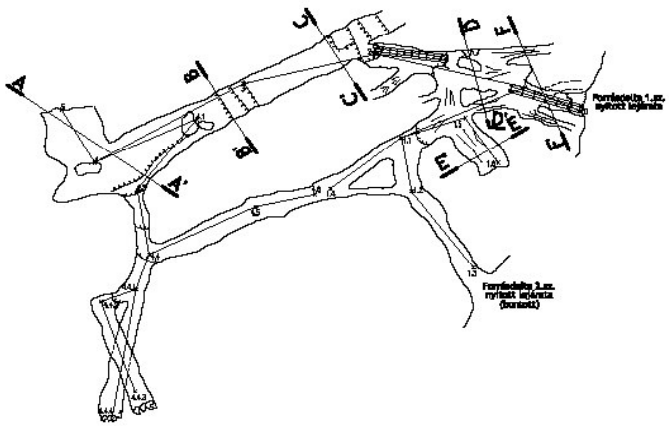
















Hosszmetszet (90°-270°)

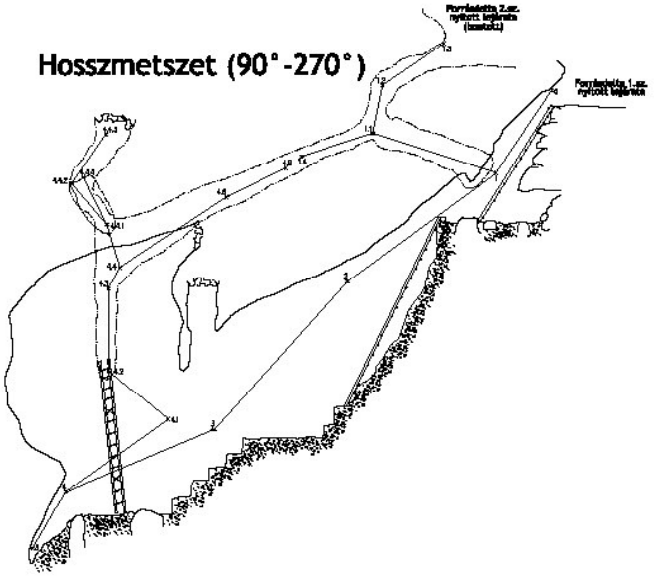

-VÁZLAT-

Felmérte:	MYOTIS Barlangkutató Egyesület 2015.
Műszer:	Függőkompasz és SUUNTO kompasz
Felmérési mód:	Fix és vesztett pontokkal
Felmérte:	Bóta Péter; Lengyel János
Rajzolta:	Bóta Péter; Lengyel János

Ilus-kúti-barlang


kataszteri szám: 5343-23

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m


A kitöltés szintje a feltárómunka kezdetén

ÉSZAK

ALAPRAJZ

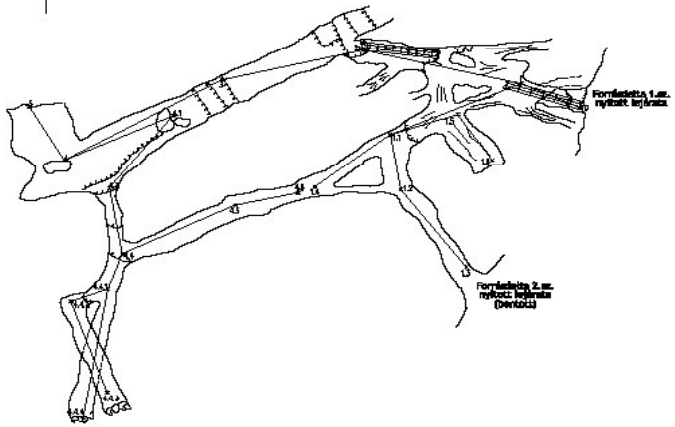

Hosszmetszet (270°-90°)

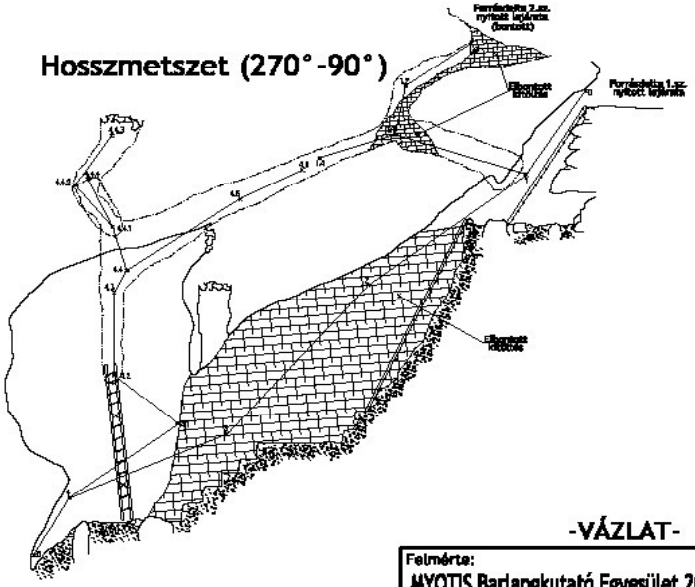

-VÁZLAT-

Felmérte:	MYOTIS Barlangkutató Egyesület 2015.
Műszer:	Függőkompasz és SUUNTO kompasz
Felmérési mód:	Fix és vesztett pontokkal
Felmérte:	Bóta Péter; Lengyel János
Rajzolta:	Bóta Péter; Lengyel János


2015.08.10 18:55

2015.08.06 15:11


2015.06.28 15:02




2015.08.06 15:06


2015.08.06 15:20

2015.08.07 15:27


2015.08.10 16:25



2015.08.10 16:35

2015.08.10 16:23


2015.08.07 15:16


2015.08.14 15:32

Kőháti Meander-barlang

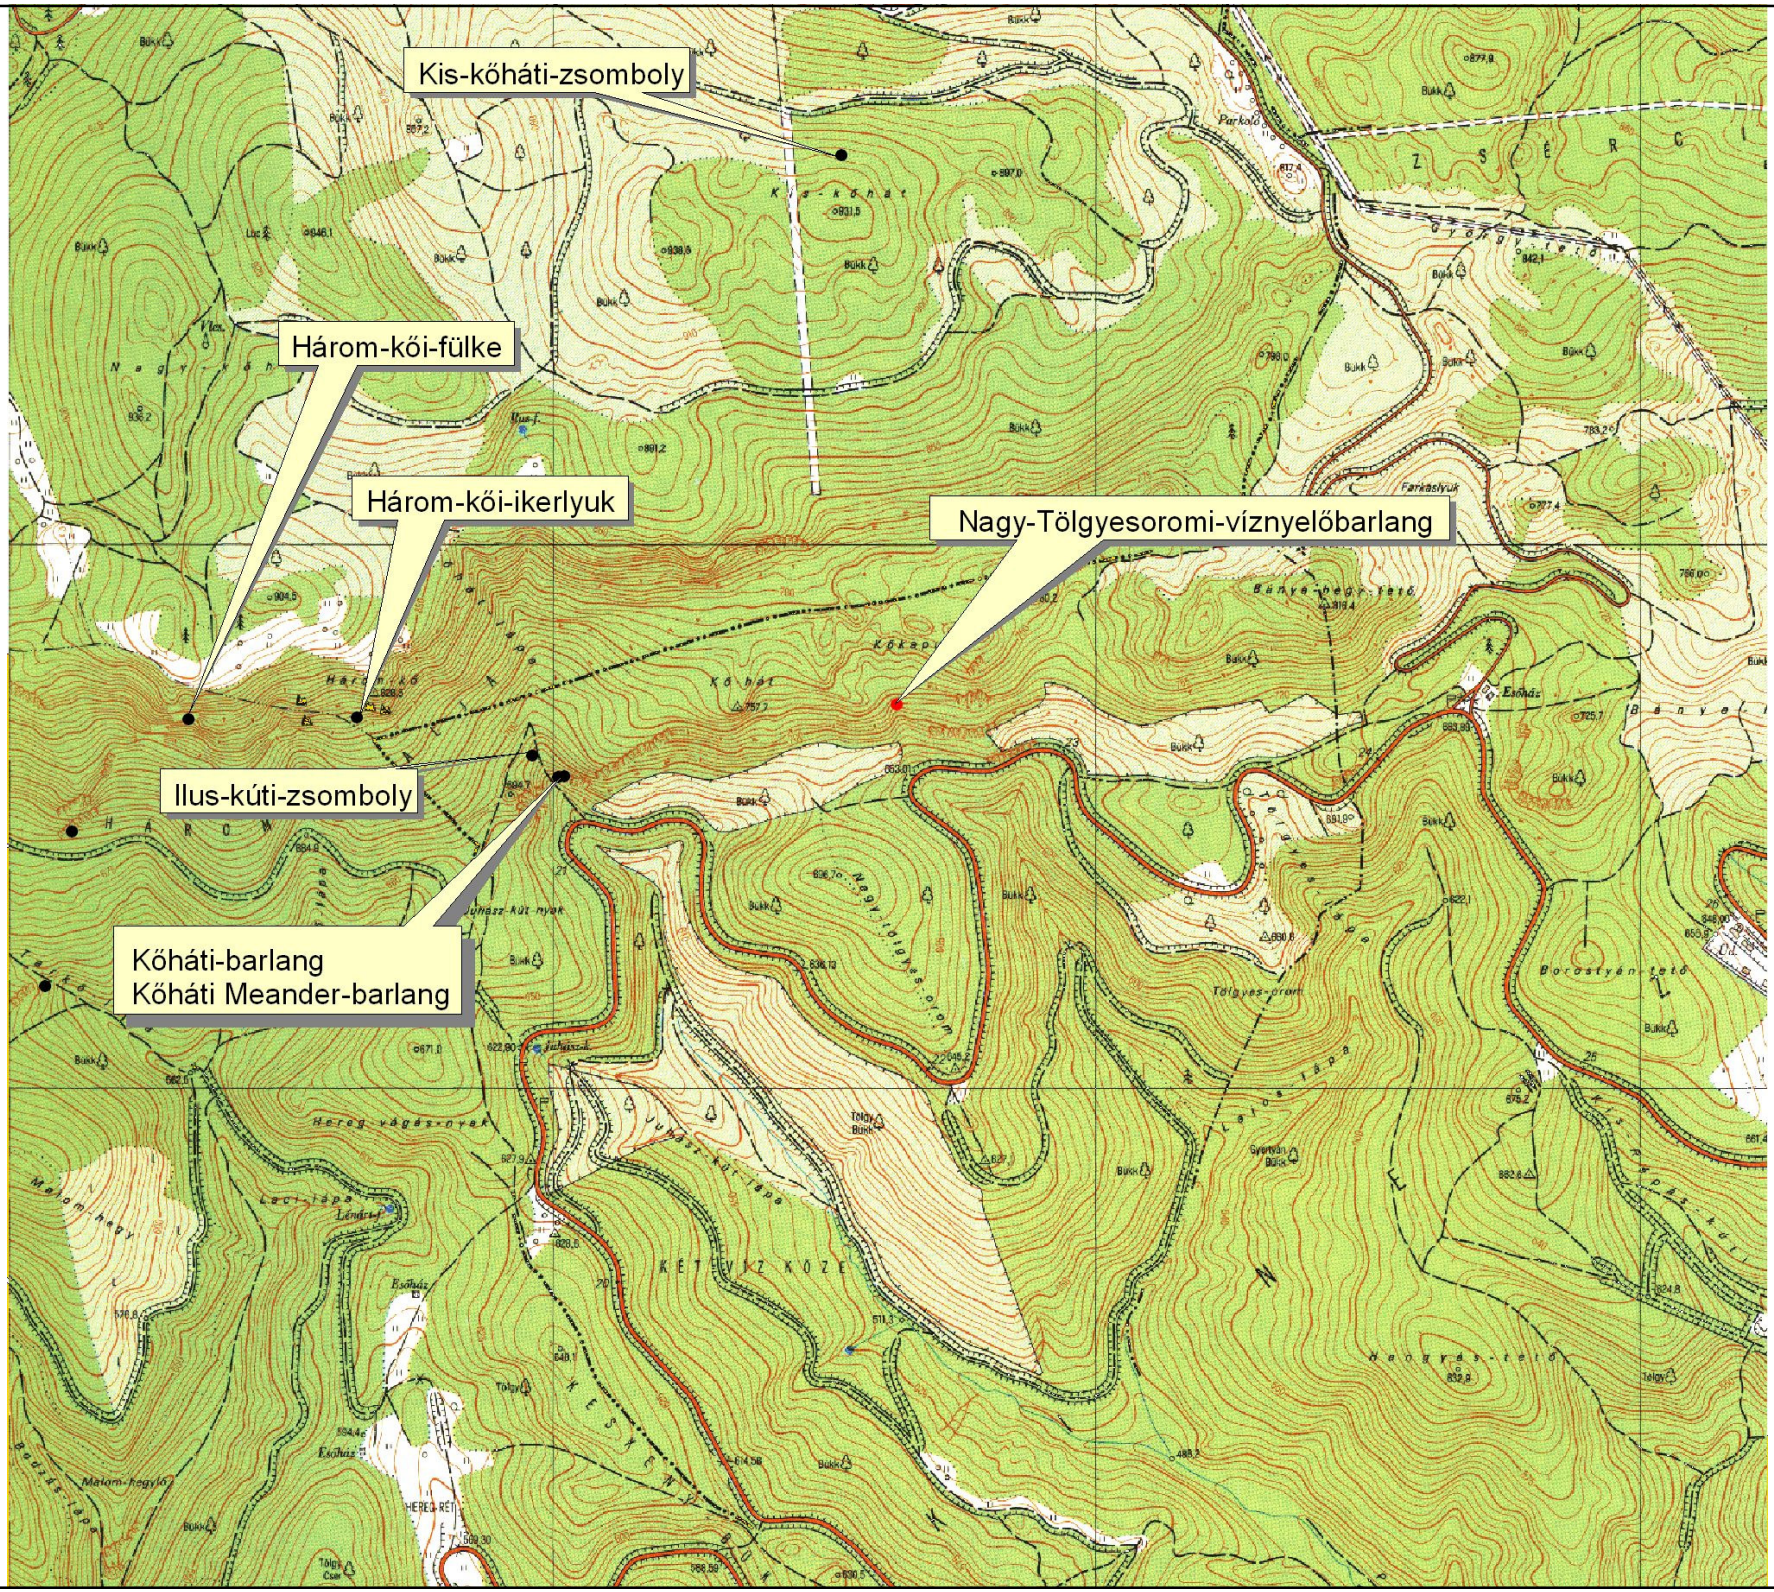

Kis-kőháti-zsomboly
Három-kői-fülke
Három-kői-ikerlyuk
Nagy-Tölgyesoromi-víznyelőbarlang
Ilus-kúti-zsomboly
Kőháti-barlang
Kőháti Meander-barlang

Kőháti Meander-barlang


kataszteri szám: 5343-24

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

Hosszmetszet (212°-38°)

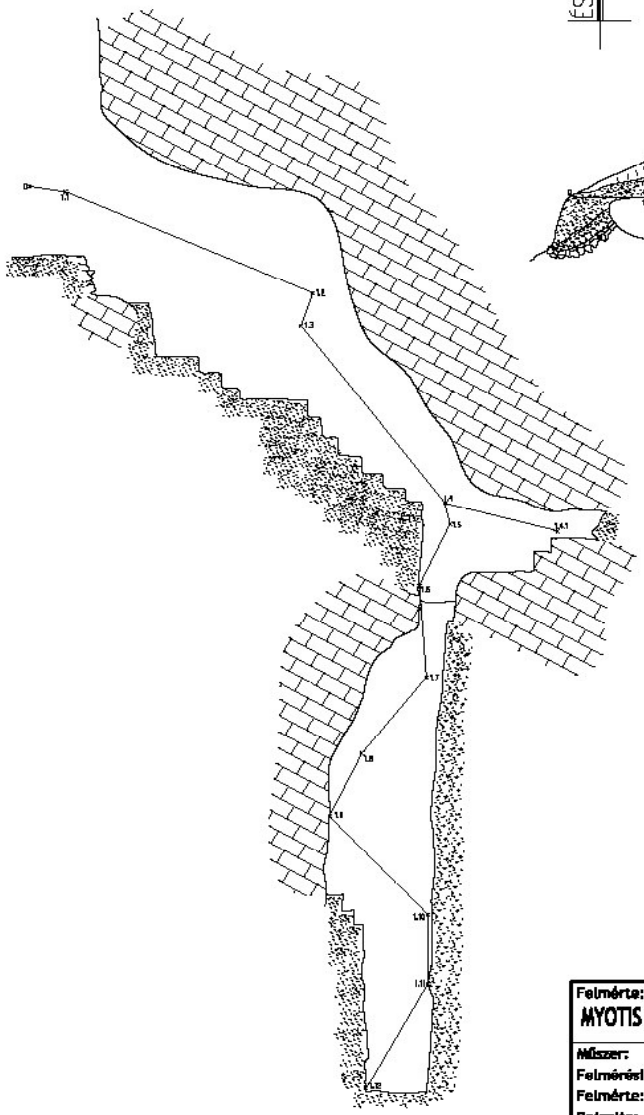

ALAPRAJZ

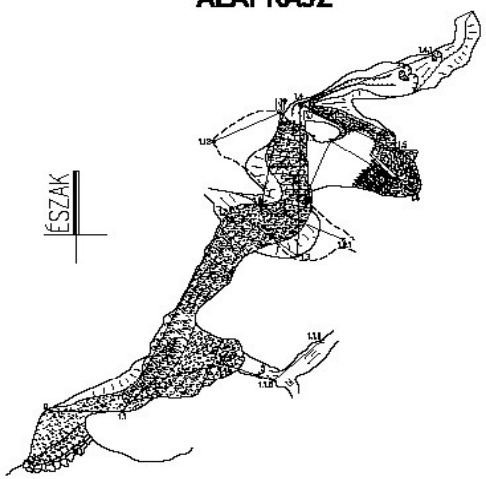

JELMAGYARÁZAT

Mészkő

Természetes eredetű kőzetek

Felmérte:
MYOTIS Barlangkutató Egyesület 2015.

Műszer:	Függőkompasz
Felmérési mód:	Fix pontokkal
Felmérte:	Barta István; Lengyel János; Rózsa Imre
Rajzolta:	Bóta Péter


Kőháti Meander-barlang

kataszteri szám: 5343-24


1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

A kitöltés szintje a feltárómunka kezdetén

Hosszmetszet (212°-38°)

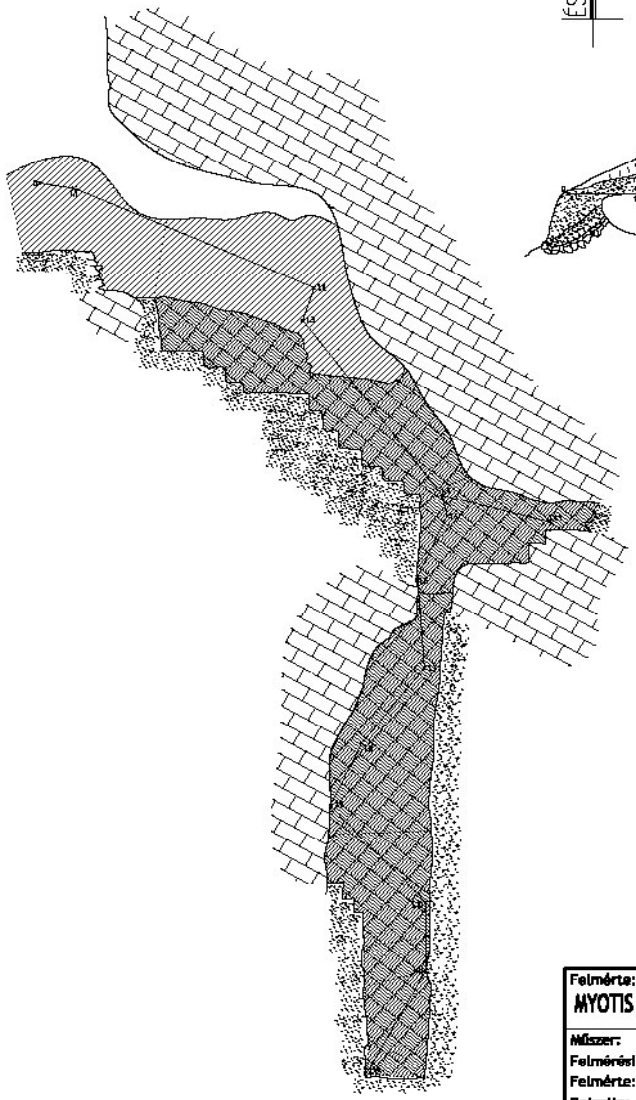

ALAPRAJZ

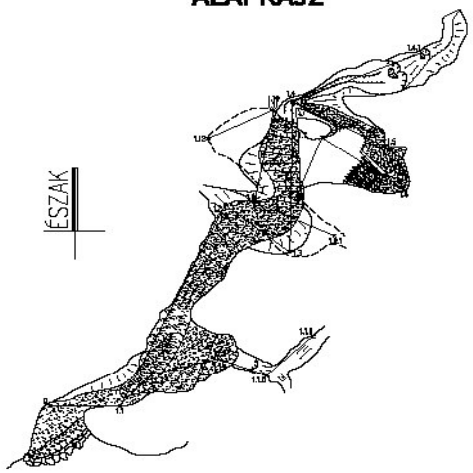

JELMAGYARÁZAT

2014-ben elbontott kitöltés

2015-ben elbontott kitöltés

Mészkő

Bemenő/kilépő eggyes kitöltés

Felmérte:	MYOTIS Barlangkutató Egyesület 2015.
Műszer:	Függőkompasz
Felmérési mód:	Fix pontokkal
Felmérte:	Barta István; Lengyel János; Rózsa Imre
Rajzolta:	Bóta Péter


01/02/2014 11:39


27/03/2014 17:33


21/04/2014 17:27

Feltárás I. ütem: talicska „sztráda”




30/03/2014 14:47

Feltárás II. ütem: szállítópálya






2015.09.26 16:50

Kombinált szállítás











A „rányelő” fejletlen oldalág



Örvény-üst 1.



Örvény-üst 2.



Kövült agyag: laminális szeptáriás gumók





A fő irány: a fejlett mennyezeti csatorna követése







