



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Bakony-Balaton
Geopark

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

projekt fejlesztési tapasztalatai

2015.06.12. Békéscsaba





14 látogatóhely

- ebből 3 látogatóközpont
- A fejlesztések az igazgatóság turisztikai fejlesztési terve alapján történnek.
- A pályázatok előtt minimum egy évvel elkezdődtek a tervezések.
- Mindhárom látogatóközpont esetében készült az engedélyeztetési terv mellett kiviteli terv és kiállítás terv.
- Más-más formai elemek



Levendula Ház Látogatóközpont, Tihany

- interaktív kiállítás
- film
- teázó
- tanösvény
- levendulás ajándékbolt



A projekt összköltsége nettó: 289.268.600 Ft
100%-ban támogatott
A projekt-megvalósítás időtartama: 2 év





Előkészítés:

- Földterület csere
- Tervek egyeztetése a rendezési tervvel
- Közművek egyeztetése (EON)
- Pályázati forrás 100 millióval kevesebb lett – újraterveztetés
- Nem minden esetben volt rugalmas a tervező, lásd vetítőterem
- Megújuló energia használata,
- Közbeszerzés bonyolultsága
- Épület építése és kiállítás építése egy kézben volt

Kiállítás tartalmi elemei:

Fő szempontok:

Épületen kívül:

- Nagy udvar, interaktív elemekkel, szabadon látogatható

Épületen belül:

- Nagy fogadótér
- Infópont, bolt, büfé mindenkinek hozzáférhető legyen
- BELÉPTETŐ!?
- Mozi terem, rövid informatív film, idegen nyelven is
- foglalkoztató
- Marketing: honlap, facebook, útbaigazító táblák (engedélyeztetés), termékek, leporelló, öltözet



Üzemeltetés:

- Üzemeltetésre két alkalommal lett meghirdetve
- Jelenlegi vállalkozó üzemelteti kezdetektől / jutalékrendszer
- Színvonalas bolt
- A vállalkozó nemzeti parki termékvédjeggyel is rendelkezik
- Marketingbe az üzemeltető jelentős lépések tesz
- Igazgatóságunkra vár a kiállítás megújítása
- Nehézkes az utógondozás (éves jelentésnél nincs kontakt)

Látogatottsági adatok:

2011.	25.393 fő
2012.	30.888 fő
2013.	33.997 fő
2014.	31.030 fő
2015.	2.900 fő

Partner belépő a Tihanyi
Bencés Apátsággal



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Bakony-Balaton
Geopark



**3D planetáriumi show
Csillagászati kiállítás:
Hold és Mars Expedíció**

**Obszervatóriumban:
professzionális
távcsőpark, naptávcső**

A projekt összköltsége nettó:
421.380.000 Ft

A projekt-megvalósítás időtartama:
2 év:





Előkészítés:

- Modern épület hozzáillesztése egy régihez. Tervek egyeztetése a rendezési tervvel (saját házunk táján elfogadtatni !!!)
- Erdők Háza kiállítás áthelyezése
- Közművek egyeztetése (EON)
- Faelgázósító kazán és napelemek
- Közbeszerzés
- Épület építése elvált a belső berendezés készítésétől
- Építkezés során szoros kapcsolat a tervezővel, főleg a kupola építésénél
- A belső berendezés beépítés egyeztetése a kivitelező céggel a planetárium szerelésénél
- Lift beépítése és engedélyeztetése
- Parkoló engedélyeztetés

Kiállítás tartalmi elemei:

Fő szempontok:

Épületen kívül:

- Parkoló kialakítása (hosszadalmas az engedélyeztetés)

Épületen belül:

- Nagy fogadótér
- Infópont, bolt
- Marketing:
- Óriás plakátok
- Demó filmek –Szőke András
- Útbaigazító táblák
- termékek, leporelló, öltözet



Üzemeltetés:

- Üzemeltetésre két alkalommal lett meghirdetve
- Jelenlegi vállalkozó üzemelteti a kezdetektől
- jutalékrendszer
- Szakavatott csillagászokkal, szakvezetés keretében
- Évről- évre folyamatos fejlesztések új filmek, új kiállítási elemek

Látogatottsági adatok:


2012.	35.438 fő
2013.	29.865 fő
2014.	26.544 fő
2015.	megvolt a 100.000. látogató budapesti gimnázium, távcsövet kaptak ajándékba



Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont

**„Csodálatos Karszt” interaktív kiállítás, 10 teremben
3D-s képek és film, kúszóbarlang,
mászófal, játszótéri elemek, csónakázás**

A projekt összköltsége nettó: **299.997.644 Ft**
100%-ban támogatásból finanszírozott projekt
A projekt-megvalósítás időtartama: 2013.04.15.-2015.01.30.
Átadás: 2015.01.20.

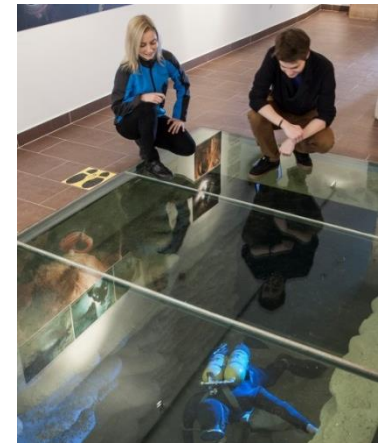



Előkészítés:

- Lakóépület megvásárlása
- Közművek egyeztetése (EON)
- Gázvezeték megszüntetése
- Faelgázosító kazán és napelemek
- Közbeszerzés
- Épület építése elvált a belső berendezés készítésétől
- A két építkezés összehangolása + a barlang üzemeltetése
- A belső berendezés beépítés egyeztetése a szakértő irányításával
- Tűzvédelmi előírások figyelembevétele
- Lift beépítése
- Mászófal és játszótér TÚV engedély

Kiállítás tartalmi elemei:

Fő szempontok:

Épületen kívül:

- Parkoló megváltás, szerződés az önkormányzattal

Épületen belül:

- Nagy fogadótér
- Infópont, bolt
- Két udvar (mozgássérült parkoló)
- 3 D képek és mozi ehhez adjuk a szemüveget
- Vendégek szakmai kísérete
- Marketing:
- Honlap, facebook – visszaszámlálása nyitás előtt apró kép és leírás
- Útbaigazító táblák
- termékek, leporelló, öltözet



Üzemeltetés:

- Saját dolgozókkal,
(munkatörvénykönyves és
közfoglalkoztatott)
- Nehéz munkaerőt találni
- Nyelvismeret is szükséges
- Kiállítás megtekintése
szakvezetőkkel, csak a
csónakázás egyéni
- Üzemeltetési szabályzat

Látogatottsági adatok:

2012. 111.960 fő

2013. augusztus végén bezártunk
106.150 fő

2014. április végén nyitott ki a barlang
114.122 fő

2015. május végéig 42.006 fő



Egyéb hasznos tanácsok

- Tervezésénél előfordul hogy kell környezetvédelmi hatástanulmány a hatósággal egyeztetés fontos
- Érdeemes nagyon komoly műszaki ellenőrt szerződtetni
- Új tűzvédelmi szabályok miatt már a kiállítás tervezésénél fontos az egyeztetés (megvan határozva, hogy a falfelület hány %-a építhető be és milyen anyaggal)
- Parkoló építési szabályok
- Lift használatbavételi csak az épülettel
- Liftre a gyártóval+ ÉMI-vel szerződés a karbantartásra
- Tisztítószer tároláshoz ÁNTSZ engedély online adatlap
- Éves jelentések EMIR-ben való feltöltése nehézkes.
- Állandóan változik a közvetítő szervezet



Kis-Balaton Látogatóközpont

Projekt tartalma:

- közel 1000 nm-es turisztikai látogatóközpont
- 2014: elkészültek a tervek, környezeti hatástanulmány, engedélyeztetés folyamatban
- 2015: projekt összeállítás, pályázat beadása
- 2017: megvalósítás

Látogatóközpont létesítése:

- időszakos és állandó kiállítási lehetőséggel
- előadóterem
- tanösvény szakvezetéssel
- pihenőhely, asztalok, padok, játszótér,
- konferenciaterem, bolt, kávézó, parkoló
- Diás-sziget fejlesztése / kenuzás





Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Bakony-Balaton
Geopark

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



bfnp.hu

facebook.com/balatonfelvideki.nemzetipark
